



# Marktrat-Sitzung Schierling

am 27. Januar 2026 - Glasfaserausbau






# CLUSTERBILDUNG– SÜD

Tiefbau versiegelte Oberfläche:  
ca. 270 km


Tiefbau unversiegelte Oberfläche:  
ca. 220 km

Adressen Graue Flecken Programm (GFP):  
ca. 7.300 Stück

Adressen Dunkelgraue Flecken Programm (DGFP):  
ca. 2.700 Stück

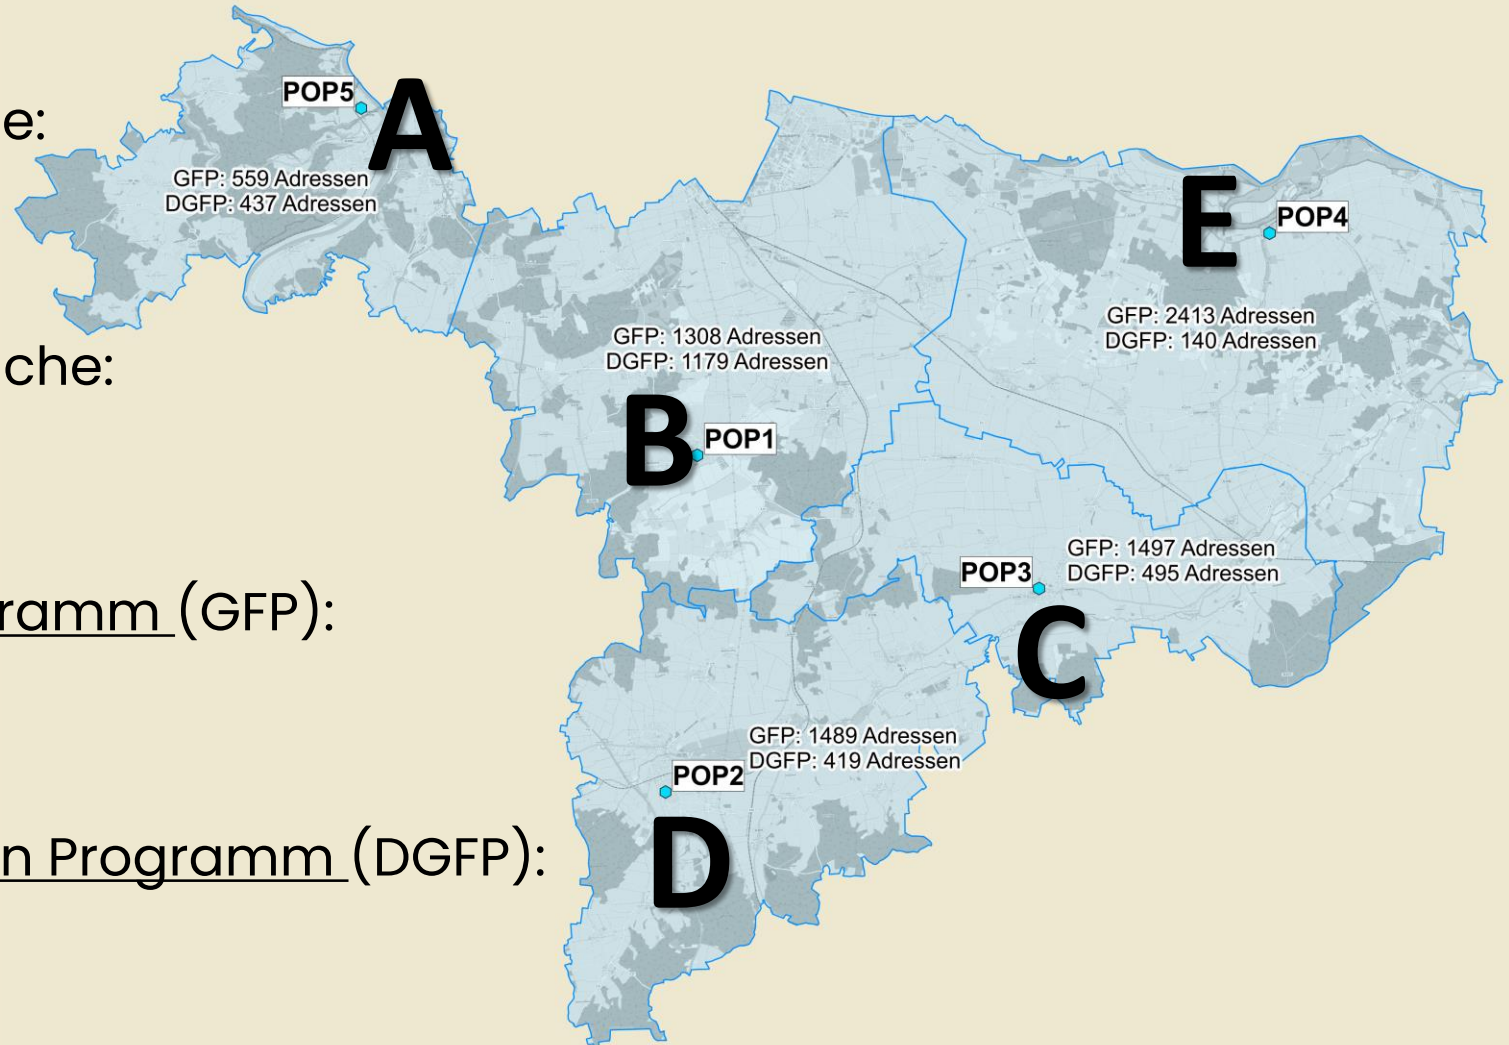

# VORLÄUFIGE AUSBAUREIHENFOLGE SÜD

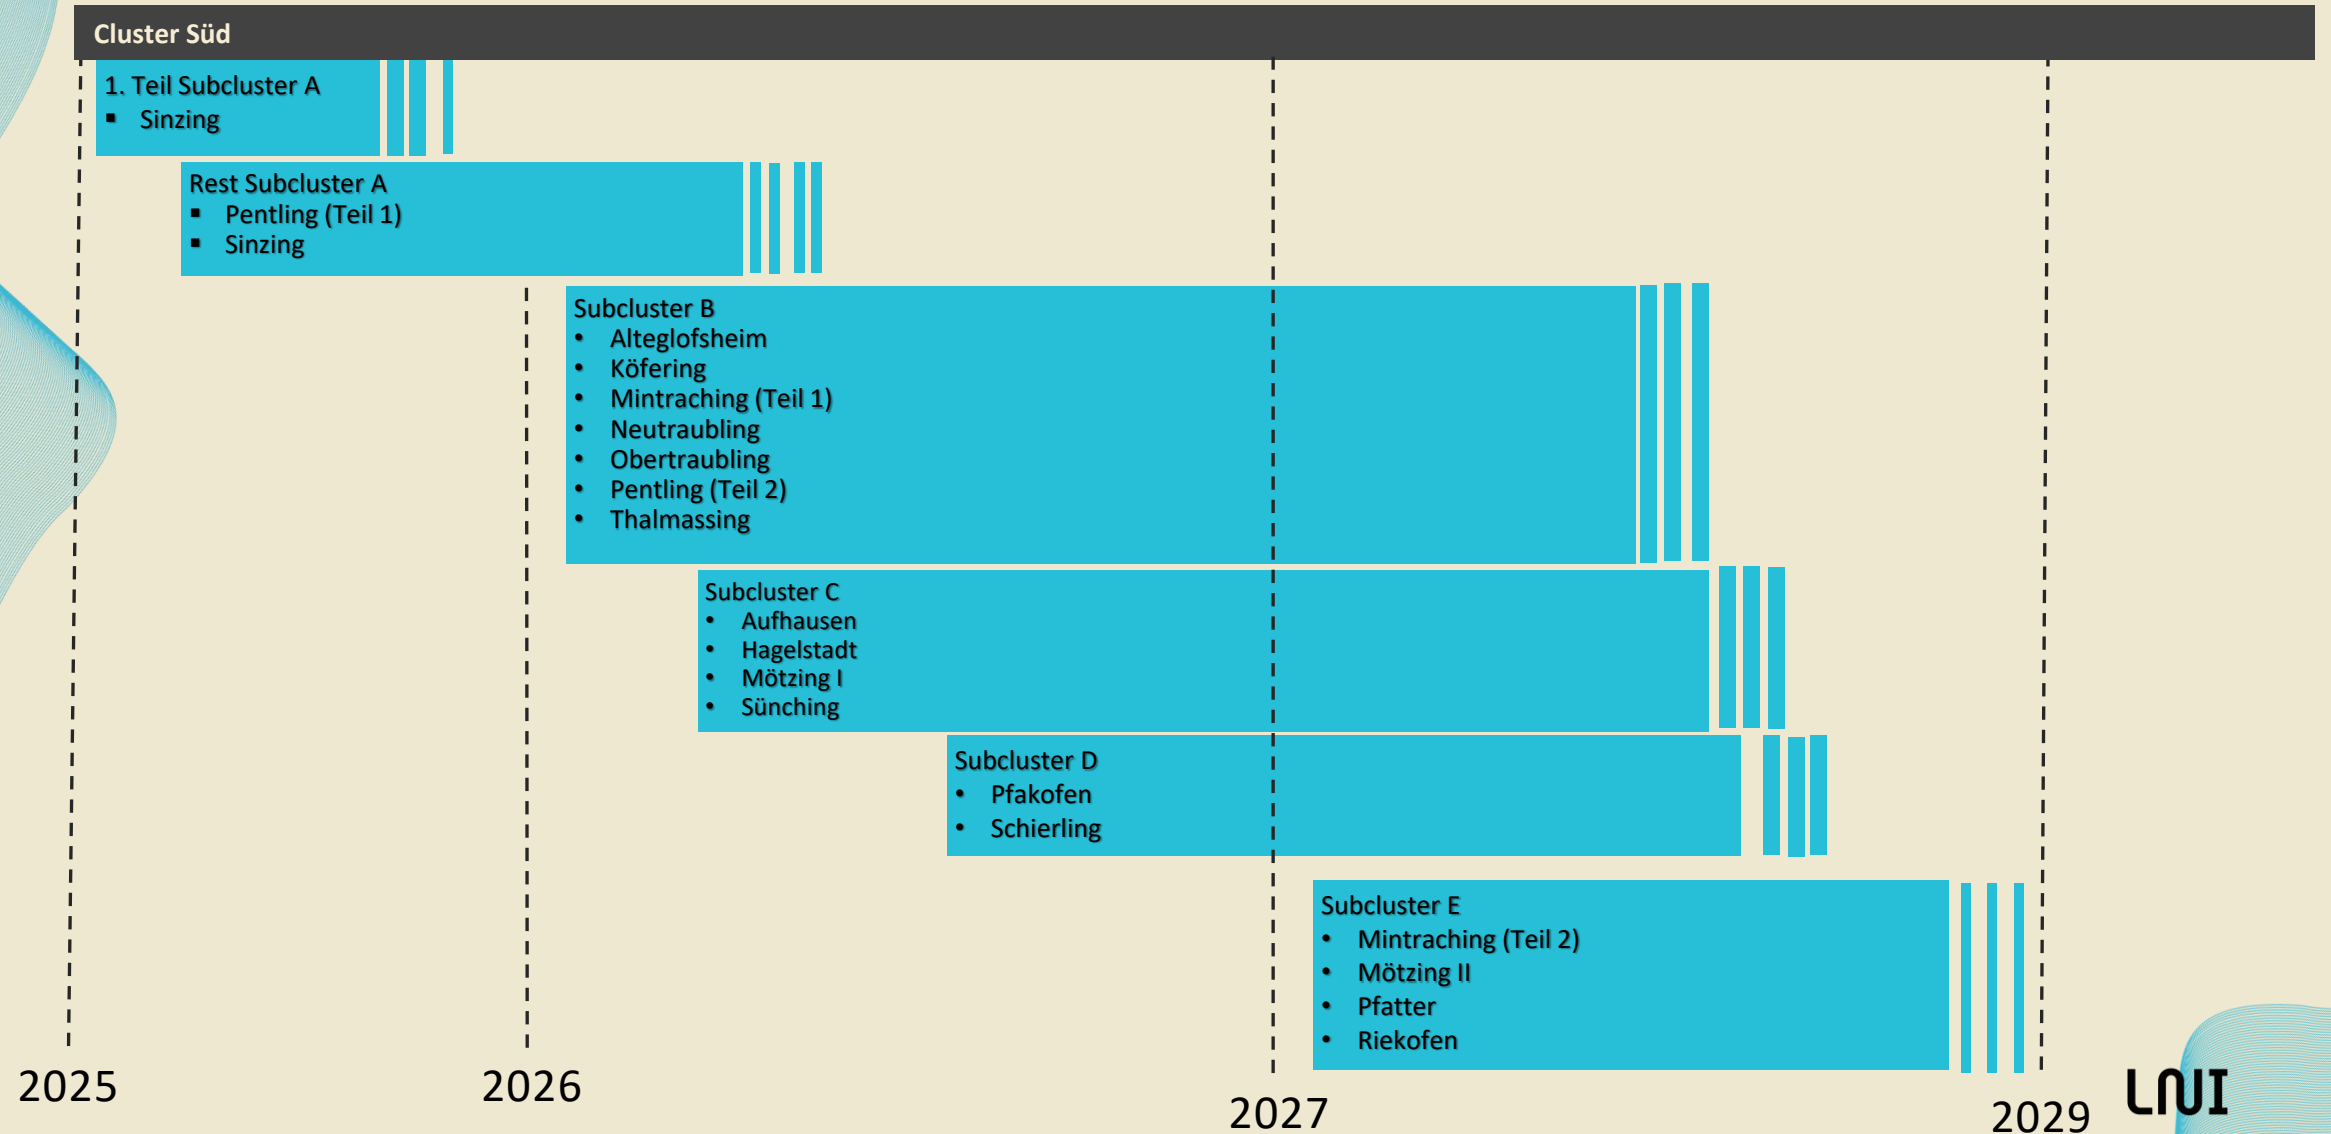



# WO STEHEN WIR IM GLASFASERAUSBAU?


## Eckpunkte Glasfaserausbau

Förderadressen gesamt: 1.600

(Schierling und Pfakofen)

Baustart geplant: Anfang Q3 2026

Baufirma:

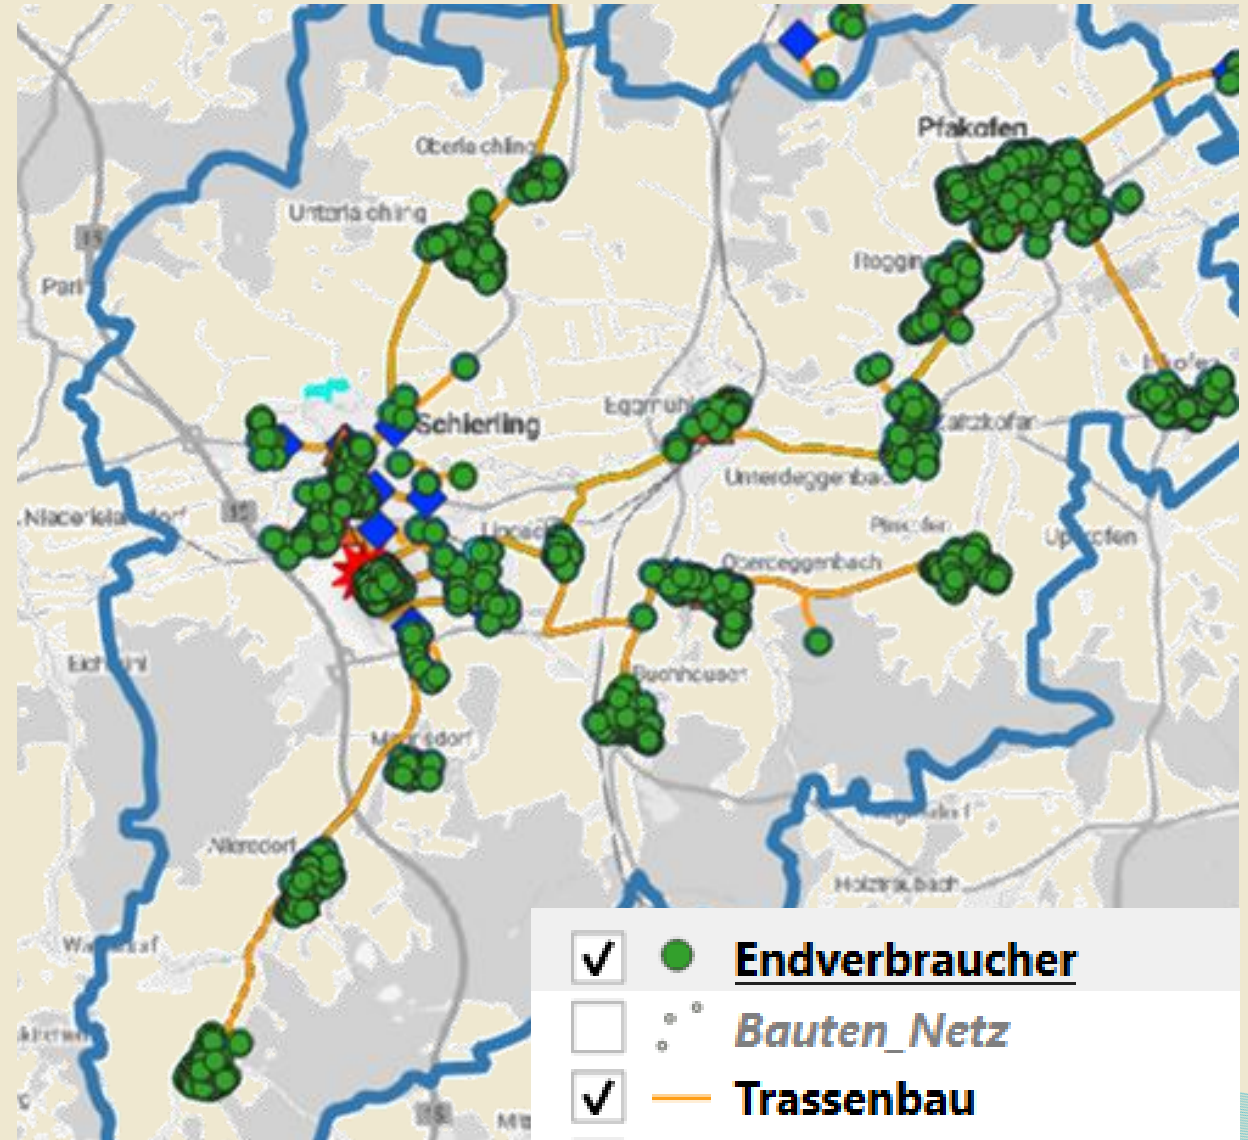

# WO STEHEN WIR IM GLASFASERAUSBAU?

| Ausbaubereich    | Genehmigungen | Privatgestattungen | HA-Verträge   | Begehungen    | Baustart   |
|------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 1.0              | abgeschlossen | abgeschlossen      | abgeschlossen | abgeschlossen | März 2025  |
| 2.0              | abgeschlossen | abgeschlossen      | abgeschlossen | laufend       | März 2026  |
| 3.0              | abgeschlossen | laufend            | laufend       | Januar 2026   | April 2026 |
| 4.0 (Schierling) | Januar 2026   | April 2026         | April         | Mai           | Juni 2026  |

VORLÄUFIG
